Zeitpunkt	Vorhandene Grundlagen	Abklären	Massnahmen
Submission	**Ist die SIA Norm 118 und SIA 431 ein Bestandteil des Werkvertrages?**  	❑ ja ❑ nein	Wenn ❑ nein, dann unbedingt in Werkvertrag integrieren. Massgebende Punkte: ➔ Siehe technisches Blatt 2 „Grundlagen für Werkverträge gemäss SIA 118 und SIA 431“ Wenn ❑ ja, dann die Vollständigkeit der Punkte im Werkvertrag prüfen. ➔ Siehe technisches Blatt 2: Grundlagen für Werkverträge gemäss SIA 118 und SIA 431
Submission	**Ist das Entwässerungskonzept nach SIA 431 in den Submissionsunterlagen enthalten?** 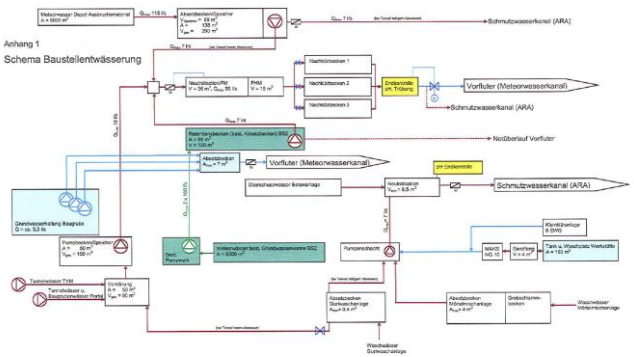 	❑ ja ❑ nein	Wenn ❑ nein, dann unbedingt mit Bauherrn / Bauleitung klären. ➔ Siehe technisches Blatt 2: Grundlagen für Werkverträge gemäss SIA 118 und SIA 431 ➔ Siehe SBV-Checkliste: TOOL WASSER (Ordner Nachhaltigkeit im Bauhauptgewerbe): Fragen bei Offertstellung, Startsitzung oder Nachträge Wenn ❑ ja, dann die Vorbereitung, AVOR für die Baustelleninstallation machen: Material, ev. Nachträge. ➔ Siehe technisches Blatt 3: Bau von Baustellenabwasseranlagen
AVOR	**Bemessung von Absetzbecken:** **Sind die Angaben vollständig?** 	❑ ja ❑ nein	Wenn ❑ ja, dann ausführen nach Vorgabe Leistungsverzeichnis. ➔ Sind alle Arbeitsgattungen berücksichtigt ➔ Zusätzliche Abwasser bedingen eine Neudimensionierung Wenn ❑ nein, dann Dimensionierung gemäss SIA 431, A2 1 Achtung: Allenfalls Beizug von Fachleuten für die Projektierung nötig.

AVOR	**Bemessung von Neutralisationsanlagen:** **Sind die Angaben Vollständig?** 	❑ ja ❑ nein	Wenn ❑ ja, dann ausführen nach Vorgabe Leistungsverzeichnis. ➔ Sind alle Arbeitsgattungen berücksichtigt ➔ Zusätzliche Abwasser bedingen eine Neudimensionierung Wenn ❑ nein, dann Dimensionierung gemäss SIA 431, A2 5 Achtung: Allenfalls Beizug von Fachleuten für die Projektierung nötig.
AVOR	**Erstellen eines Installationsplanes:** **Sind alle Angaben Vollständig?** 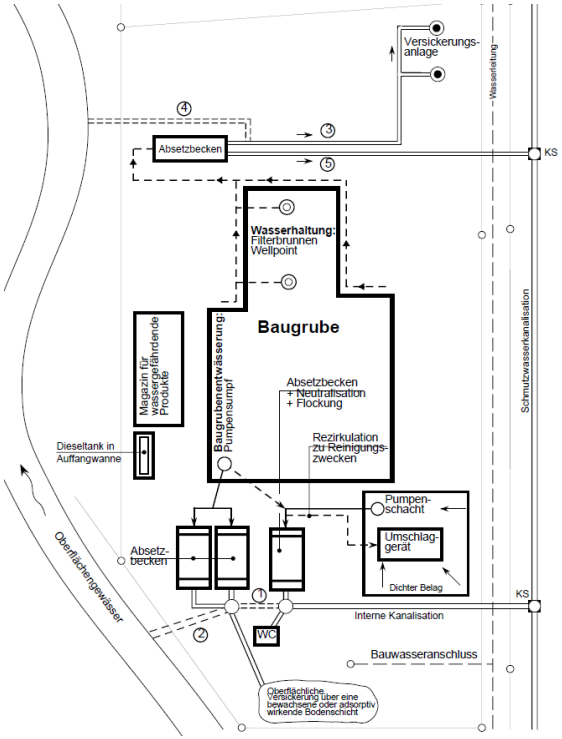	❑ ja ❑ nein	Wenn ❑ ja, dann ausführen nach Vorgabe Leistungsverzeichnis. ➔ Arbeitssicherheit (Absturz, Verkehrswege, Spriessungen usw.) in den Installationsplan integrieren. Wenn ❑ nein, dann Installationsplan gemäss SIA 431, A3 ➔ Siehe SBV-Checkliste: TOOL WASSER (Ordner Nachhaltigkeit im Bauhauptgewerbe): Fragen bei Offertstellung, Startsitzung oder Nachträge. ➔ Zu beachten sind folgende Punkte: ❑ Wo sind die sanitären Anlagen der Baustelle angeschlossen? ❑ Wohin wird das Abwasser des Bauprozesses Abgeleitet? ❑ Wohin läuft das Oberflächenwasser? ❑ Wohin läuft das Reinigungswasser (Waschplatz, Ölabscheider)? ❑ Wo wird die Wasserhaltung (Pumpenschacht, Filterbrunnen, Wellpoint) geführt? ❑ Sind Versickerungsanlagen vorgesehen? Wenn ja, Bewilligung? ❑ Ist die Funktionstüchtigkeit von Absetzbecken oder/und Neutralisationsanlagen (mit/ohne Flockung) gewährleistet? - Sind die Anschlüsse richtig erstellt? - Ist der Unterhalt gewährleistet? (Reinigung / Schlammentsorgung) - Wurden Vorsorgemassnahmen getroffen? (Regen / Gewitter / Hochwasser) ❑ Ist der Standort des Magazins für wassergefährdende Produkte zweckmässig? ❑ Ist der Standort des Dieseltanks zweckmässig?
